

NOM DU TRAVAIL  
**1035818 - SFR DISTRIBUTION Villars**

IDENTIFIANT  
PMP.826140.36312362

ATTRIBUÉS  
Boutiques SFR

LIEU  
1035818 - SFR DISTRIBUTION Villars

STATUT  
**Finalisé (100%)**

DATE DE FIN  
17-10-2022 14:54:46

#### OBSERVATIONS

filtres et diffuseurs propres et désinfectés machine fonctionnant correctement un plénum est nécessaire pour l'extraction 590x590 400 haut avec bouche 350D sur le dessus

#### GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

ADRESSE  
Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

EMAIL  
geral@jpnclimatizacao.pt

#### CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

#### CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

#### BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION VILLARS

ADRESSE  
C CIAL AUCHAN PORTES DU FOREZ - CCial  
42390  
VILLARS

#### CONTACTS

**SFR DISTRIBUTION Villars**  
espacesfr.1607@sfr.com  
04 82 28 52 78

#### ACTIFS

ÉQUIPEMENT (RIDEAU D'AIR CHAUD )



TYPE  
RIDEAU D'AIR CHAUD  
LIEU  
SFR DISTRIBUTION VILLARS - GÉNÉRAL  
CODE  
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A1. MARQUE  
Thermoscreens

A2. MODÈLE  
C2-1500ER

A3. N° DE SÉRIE  
818614003

A4. ANNÉE DE FABRICATION  
2019

TÂCHES

Verification Generale

EFFECTUÉ

DESCRIPTION

Maintenance des installations de climatisation

- A01. VÉRIFICATION ET NETTOYAGE DES GRILLES DE REPRISE D'AIR
- A02. VÉRIFICATION ET NETTOYAGE DES GRILLES DE SOUFFLAGE D'AIR
- A03. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES MOTEURS VENTILATEURS
- A04. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES SUPPORTS MOTO VENTILATEURS
- A05. VÉRIFICATION DE L'ÉQUILIBRAGE DES MOTO VENTILATEURS
- A06. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS
- A07. VÉRIFICATION GÉNÉRALE DU COMPARTIMENT AÉRAULIQUE
- A08. VÉRIFICATION DU BON SERRAGE DE LA VISSERIE
- A09. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES RÉSTANCES ÉLECTRIQUES DE CHAUFFAGE
- A10. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES CÂBLES ET FILS ÉLECTRIQUES
- A11. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DU PETIT APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
- A12. VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
- A13. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES COMMANDES ET THERMOSTATS
- A14. VÉRIFICATION DES ÉVENTUELLES COMMANDES OU ASSERTISSEMENTS EXTERNES (GTC, LIGNE PILOTE...)

Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conforme

PHOTOS DE TÂCHES



ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)



TYPE  
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR  
LIEU  
SFR DISTRIBUTION VILLARS - GÉNÉRAL  
CODE  
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. MARQUE Mitsubishi electric	A02. MODÈLE UNITÉ INTERIEUR 1 PEAD-RP125JAQ	A03. N° DE SÉRIE UNITÉ INTÉRIEUR 1 1M03801	A08. ANNÉE DE FABRICATION 2011
------------------------------------	--	---	-----------------------------------

TÂCHES

Verification Generale




EFFECTUÉ

DESCRIPTION

Maintenance des installations de climatisation

A01. VÉRIFICATION, NETTOYAGE OU REMPLACEMENT DES FILTRES (SI MÉDIA)	Conforme
A02. VÉRIFICATION ET NETTOYAGE DES GRILLES DE REPRISE D'AIR	Conforme
A03. VÉRIFICATION ET NETTOYAGE DES GRILLES ET DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE D'AIR	Conforme
A04. VÉRIFICATION GÉNÉRALE DE LACARROSSERIE DES UNITÉS EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE	Conforme
A05. VÉRIFICATION GÉNÉRALE DES COMPARTIMENTA AÉRAULIQUES	Conforme
A06. VÉRIFICATION GÉNÉRALE DES COMPARTIMENTS FRIGORIFIQUES	Conforme
A07. VÉRIFICATION DES BATTERIES FROIDES (REDRESSAGE DES AILETTES SI NÉCESSAIRE)	Conforme
A08. VÉRIFICATION DES BATTERIES CHAUDES OU RÉSISTANCES (REDRESSAGE DES AILETTES SI NÉCESSAIRE)	Conforme
A09. VÉRIFICATION ET NETTOYAGE DU BAC Á CONDENSATS	Conforme
A10. VÉRIFICATION DES BATTERIES DU CONDENSEUR Á AIR	Conforme
A11. VÉRIFICATION DU BON SERRAGE DE LA VISSERIE	Conforme
A12. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES SUPPORTS COMPRESSEURS	Conforme
A13. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES SUPPORTS MOTO VENTILATEURS	Conforme
A14. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES CÂBLES ET FILS ÉLECTRIQUES	Conforme
A15. VÉRIFICATION DU BON SERRAGE DES FILS ÉLECTRIQUES	Conforme
A16. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DU PETIT APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE	Conforme
A17. VÉRIFICATION DE L'ÉQUILIBRAGE DES MOTO VENTILATEURS	Conforme
A18. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS	Conforme
A19. VÉRIFICATION DES PRESSIONS DE REFOULEMENT ET D'ASPIRATION DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE	Conforme
A20. VÉRIFICATION DES TEMPÉRATURES DU RÉSEAU FRIGORIFIQUE (ASPIRATION, REFOULEMENT...)	Conforme
A21. VÉRIFICATION DES TEMPERATURES DU RÉSEAU AÉRAULIQUE (SOUFFLAGE, REPRISE, AMBIANCE...)	Conforme
A22. VÉRIFICATION DE LA CHARGE EN FLUIDE FRIGORIGÈNE	Conforme
A23. VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE	Conforme
A24. VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT HYDRAULIQUE	Conforme
A25. VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT AÉRAULIQUE	Conforme
A26. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES LIAISONS FRIGORIFIQUES	Conforme
A27. VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ÉVENTUELLE POMPE DE RELEVAGE	Conforme
A28. VÉRIFICATION DE LA TENSION DES COURROIES	Conforme
A29. VÉRIFICATION DE L'ACIDITÉ DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE EN CAS D'ANOMALIE	Conforme
A30. VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL	Conforme
A31. VÉRIFICATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DES COMMANDES ET THERMOSTATS	Conforme
A32. VÉRIFICATION DES PERFORMANCES FRIGORIFIQUES ET CALORIFIQUES	Conforme
A33. VÉRIFICATION DES ÉVENTUELLES COMANDES OU ASSERVISSEMENTS EXTERNES (GTC, LIGNE PILOTE...)	Conforme

PHOTOS DE TÂCHES

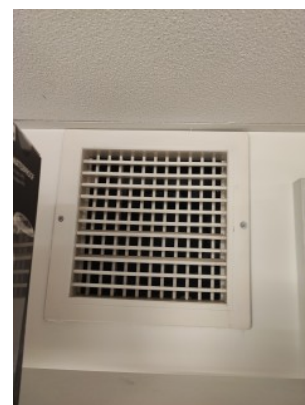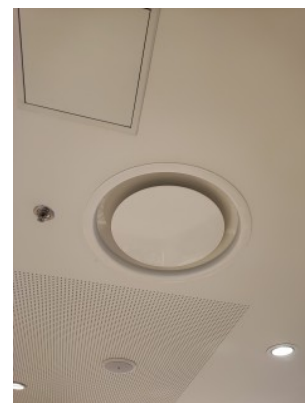

PLANNED JOB ORDER FILES



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(17-10-2022 15:01:30)
